

Wohnanlage Remsblick, Waiblingen

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: WA Remsblick, Waiblingen
Betrachtungszeitraum: Juli 2010
Bauherr: Demir Demiri

Aktueller Bautenstand:


1. Baugrubenaushub

Der Baugrubenaushub ist abgeschlossen. Wie beabsichtigt wurde das zur Wiederverfüllung der Arbeiträume vorgesehene Material im Bereich von Haus 5 zwischengelagert. Die Baugrubenböschung wurde durch Anbringung der Böschungsfolie gesichert. Das Schnurgerüst wurde angebracht und eingemessen.



2. Pfahlgründung

Die Pfahlgründung ist fertiggestellt. Die duktilen Gusspfähle konnten wie geplant in allen Bereichen gerammt und verfüllt werden.

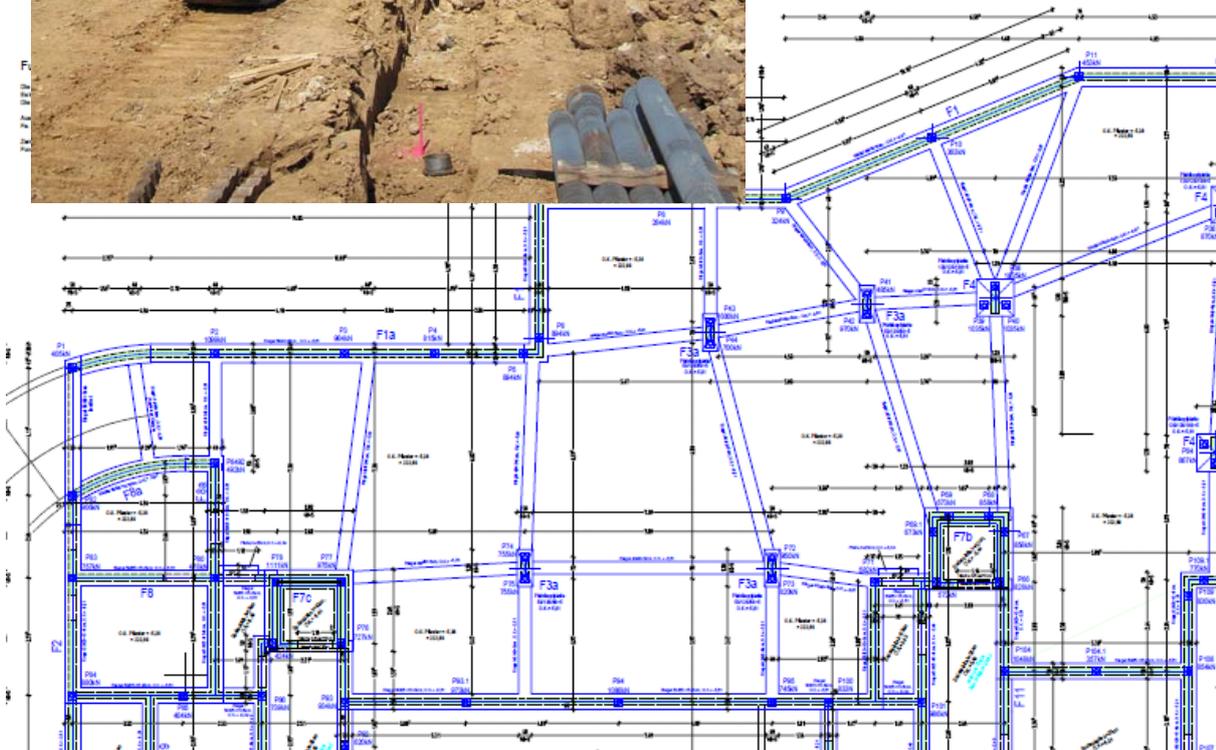

3. Streifenfundamente und Aufzugsunterfahrten

Der Aushub der Fundamente und der Aufzugsunterfahrt ist größtenteils fertiggestellt. Die Fundamente wurden eingemessen. Mit den Betonarbeiten wird begonnen.



4. Spatenstich

Am Mittwoch, den 21.07.2010 hat der Spatenstich stattgefunden. Nach feierlicher Ansprache wurde bei einem gemeinsamen Mittagessen Kontakt mit den Erwerbern aufgenommen.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten	Fertigstellungsgrad
Baustelleneinrichtung	95 %
Baugrube, Böschungssicherung (TG, Haus 1-4)	100 %
Gründung – duktile Gusspfähle	100 %
Fundamentaushub	80 %
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	begonnen
